

Avancées des actions
du Contrat de
Milieux

-

Volet Ressource



AVANCEMENT DES ACTIONS

- Un total de 1 255 964€ de montant d'action prévisionnel
- 482 215 € d'aide prévisionnelle de l'agence de l'eau
- 350 323 € d'aide prévisionnelle du Conseil Départemental




- Ce volet est animé au travers du PGRI et bénéficie d'un soutien particulier par l'agence de l'eau et le Conseil Département



Volet Ressource (14 actions)

Non engagée	2	14%
Initiée	5	36%
Engagée	4	29%
Terminée	3	21%

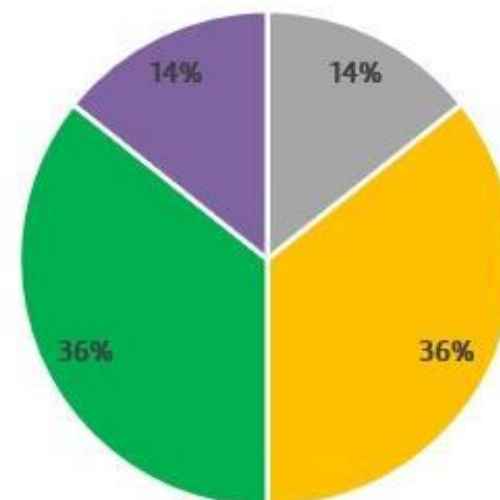

AVANCEMENT DES ACTIONS



N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
RE1	Observatoire des prélèvements et des usages	Engagée	Syr'Ussees	I	2023	30 000,0 €	
RE2	Schéma territorial d'économie et de gestion de la ressource en eau du bassin versant des Ussees	Terminée	Syr'Ussees	F	2022		65 720,0 €
RE3	Mise à jour du schéma directeur Alimentation Eau Potable de la CCPC	Non engagée	CCPC	I	2023	200 000,0 €	

● Observatoire des prélèvements et des usages

Outil d'aide à la décision pour le territoire

Support de plusieurs indicateurs: météo, occupation du sol, débit, etc.


- A débuté en 2018
- Montant total de l'observatoire = 119 714,48 € TTC

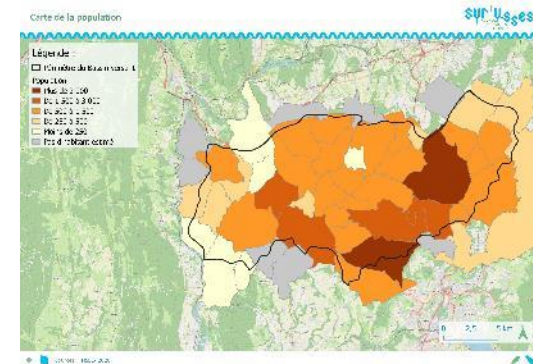



AVANCEMENT DES ACTIONS

- Schéma Territorial d'Economie et de Gestion de la Ressource en eau
 - Une phase de mise à jour des données du bilan quantitatif, des régimes hydrologiques
 - Une phase de concertation du territoire en fonction de l'évolution possible des débits des UsseS aux horizons 2050 et 2100
 - Une phase opérationnelle composée de feuilles de route et de notes technique sur la réutilisation des eaux usées traitées, l'implantation de retenues collinaires et la mobilisation de la ressource venant du fleuve Rhône
- Pour rappel, étude ayant aussi démarrée en 2018
- Montant total du schéma = 132 459, 66 € TTC

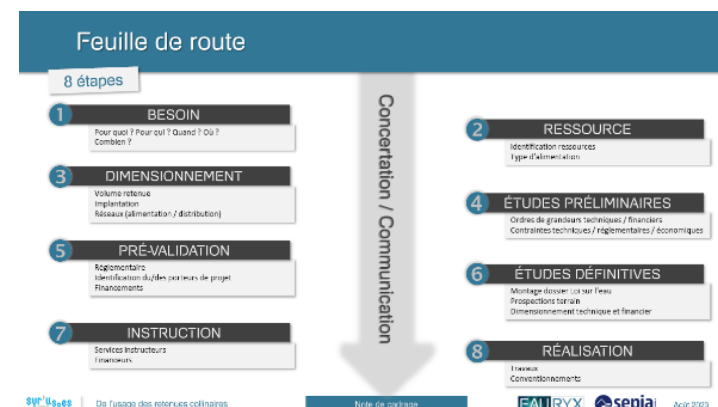

AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Usses	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
RE4	Travaux sur le réseaux d'eau potable de Frangy	Engagée	Frangy	I	2022	95 211,0 €	
RE5	Travaux sur le réseau d'eau potable de la CCPC	Terminée	CCPC	I	2022	340 000,0 €	
RE6	Travaux sur le réseau d'eau potable de Contamine Sarzin	Engagée	Contamine-Sarzin	I	2022	7 533,0 €	
RE7	Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable à Bassy	Terminée	Bassy	I	2022	210 000,0 €	
RE8	Restitution du trop-plein du captage de Sous-Grille - travaux	Initiée	CCG	I	2023	100 000,0 €	

● Travaux sur réseaux AEP terminés :

- CCPC montant total = 585 000 € HT
- Bassy montant total = 197 442 € TTC

● Travaux à poursuivre par les autres collectivités, notamment sur l'amélioration des connaissances des réseaux, la gestion durable des services de l'eau et les économies d'eau

● Finalisation de l'abandon du prélèvement sur la source de la Douai et restitution du débit aux Usses

AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Usses	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
RE9	Etude reprise captage de Mallabranche	Initiée	CCPC	I	2022	30 000,0 €	
RE10	Etude de Faisabilité : exploitation d'un nouveau forage sur le BV Fier	Engagée	CCFU	I	2022	50 000,0 €	
RE11	Recherche de nouvelles ressources en AEP, venant en substitution de ressources utiles au milieu naturel	Initiée	CCUR	I	2024	25 000,0 €	

- **Etudes non débutées:** en attente des mises à jour des schémas directeur alimentation en eau potable de la CCPC et de la CCFU

AVANCEMENT DES ACTIONS


N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
RE12	Amélioration des connaissances des prélèvements agricoles et adaptation au CC - matériels et dispositifs hydroéconomiques	Initiée	CASMB	I et F	2023	10 000,0 €	20 000,0 €
RE13	Etude pour la mise en place d'un OUGC (organisation collective des prélèvements agricoles)	Initiée	CASMB	F	2023		22 500,0 €
RE14	Installation de matériels hydroéconomiques pour les bâtiments publics et les foyers des habitants	Non engagée	Syr'Ussees	I	2023	50 000,0 €	

● Agriculture :

- Concertation du monde agricole, formation et retours d'expérience réalisés en 2023
- La création d'un OUGC est encore en réflexion
- Le plan d'adaptation au changement climatique a été enclenché
- L'amélioration des connaissances des prélèvements doit se poursuivre

*Intervention de
Mme Pierrette BATON
MARECHAL
Adjointe*

CONTAMINE SARZIN



Avancées des actions du Contrat de Milieu

-

Volet Milieu




AVANCEMENT DES ACTIONS

- Un total de 1 812 373€ de montant d'action prévisionnel
- 908 854 € d'aide prévisionnelle de l'agence de l'eau
- 215 293 € d'aide prévisionnelle du Conseil Départemental
- 11 801 € de CNR et la Société de Pêche de Frangy



Pêche de Frangy La Truite du Val des Ussees

Volet Milieux (26 actions)		
Non engagée	3	21%
Initiée	10	71%
Engagée	12	86%
Terminée	1	7%

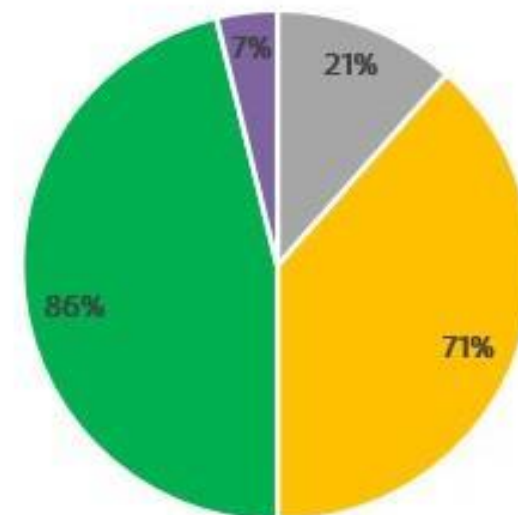

■ Non engagée ■ Initiée ■ Engagée ■ Terminée

AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA1	Stratégie et maîtrise foncière des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau (aval Ussees, Bonlieu)	Engagée	Syr'Ussees	I	2022	100 000,0 €	
MA2	Stratégie et maîtrise foncière des parcelles de zones humides prioritaires	Engagée	Syr'Ussees, communes	I	2023	15 000,0 €	
MA3	Renouvellement de la DIG	Initiée	Syr'Ussees	F	2023		30 000,0 €

● Maitrise Foncière Rivières :

- Acquisition à l'amiable et par voie d'expropriation
- Au 31/12/2023, le Syr'Ussees est propriétaire de 20 ha
- Montant engagé depuis 2022 (du 01/01/2022 au 31/12/2023) de 144 411 €


● Maitrise Foncière Zones Humides :

- Acquisition à l'amiable et convention d'usage lors de refus de vente
- Au 31/12/2023 : 2 promesses de vente au profit du Syr'Ussees (Etang de Mercanton) pour **1,1 ha** et un montant de **12 214,80€**
- Les conventions d'usage représentent **10,26 ha**




AVANCEMENT DES ACTIONS


Maitrise foncière du Syndicat

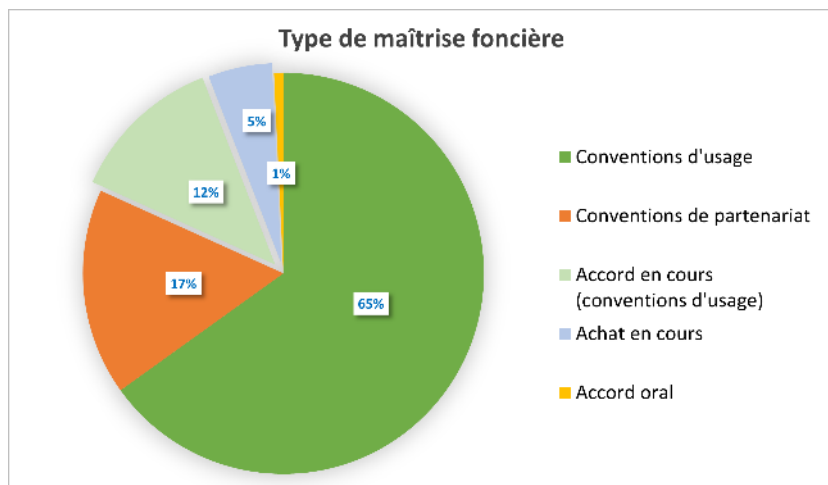


Zones humides prioritaires – contrat de milieux des Usses

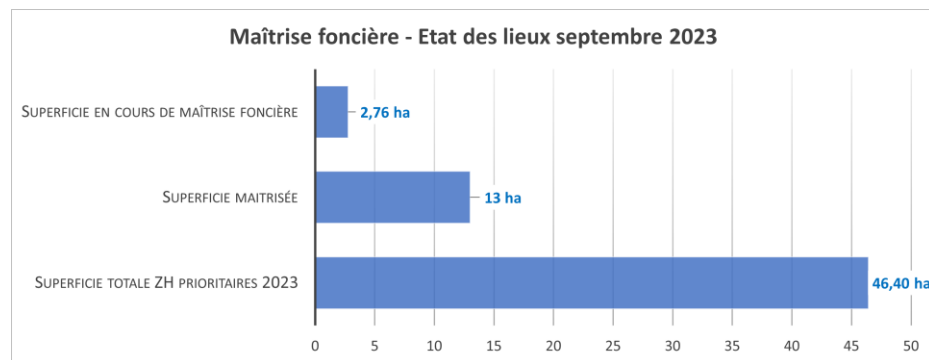

AVANCEMENT DES ACTIONS

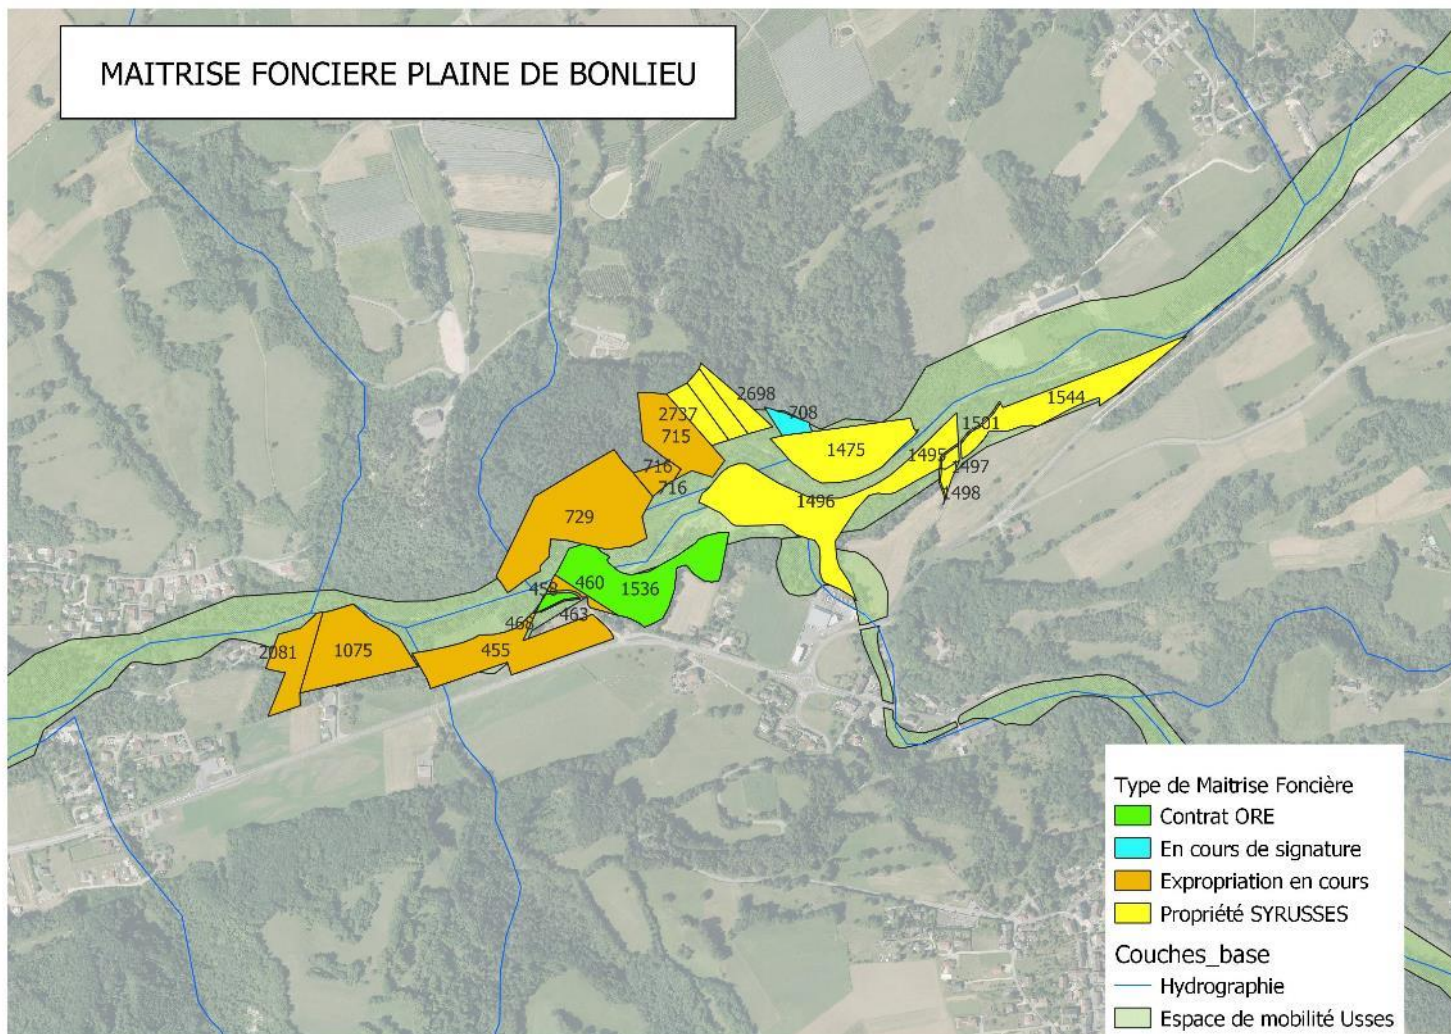

AVANCEMENT DES ACTIONS

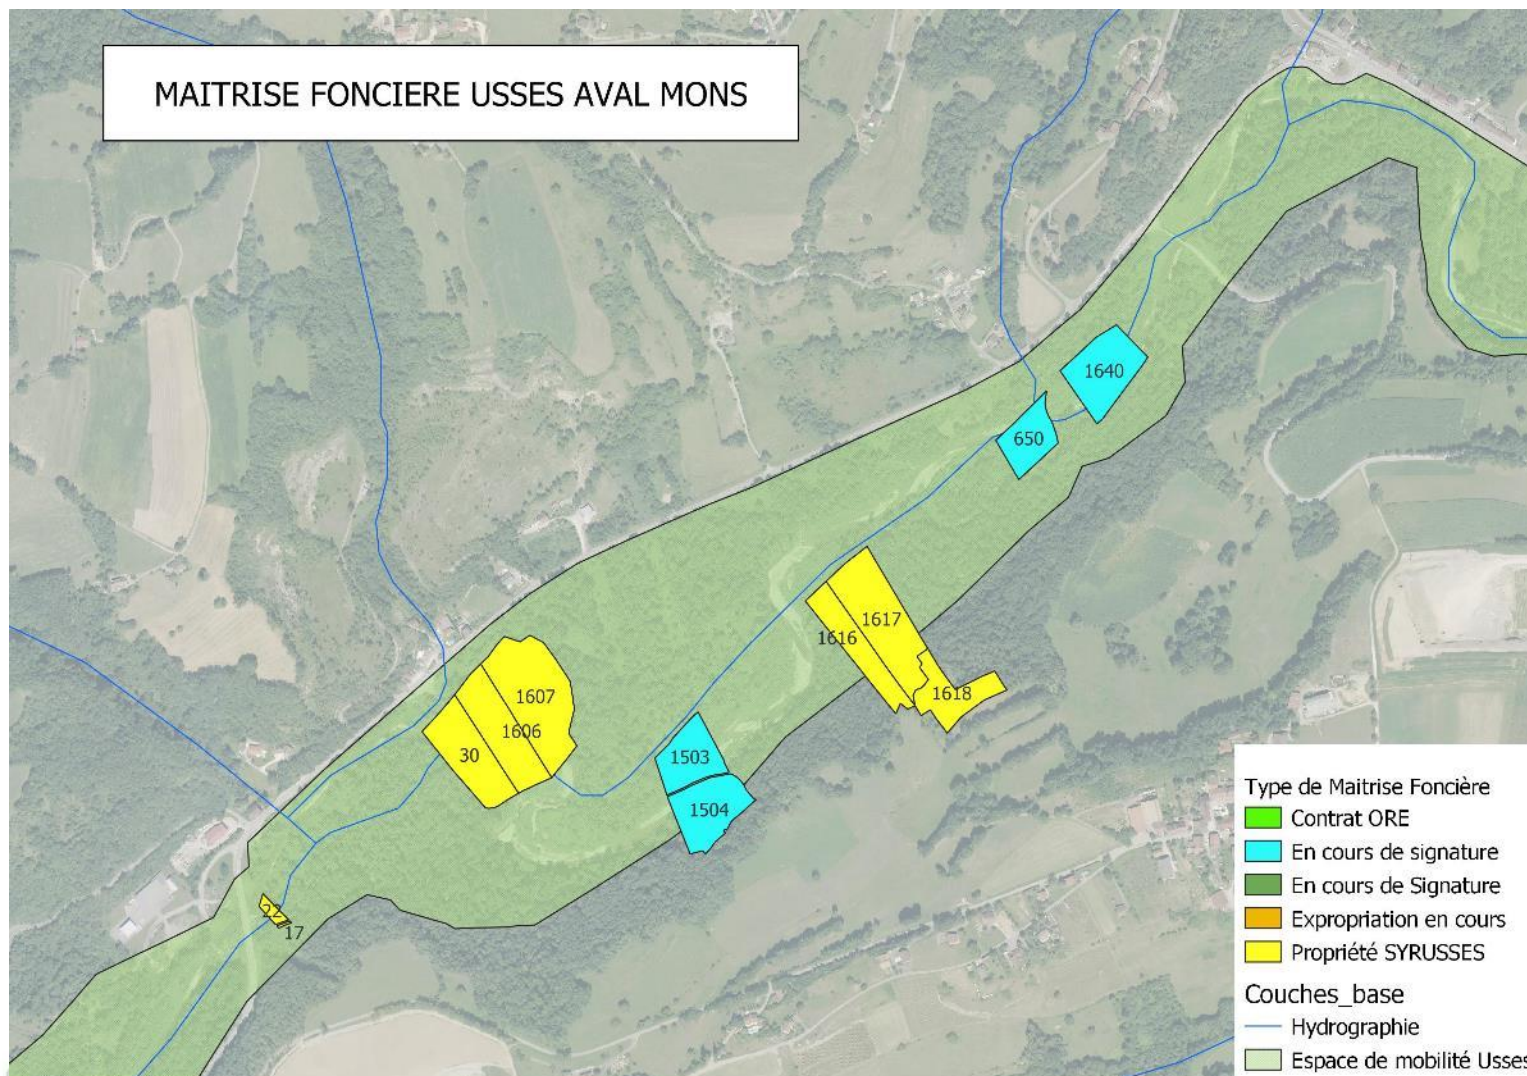

AVANCEMENT DES ACTIONS


N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Usses	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA4	Restauration hydromorphologique de la Plaine de Bonlieu	Engagée	Syr'Usses	I	2023	538 166,0 €	
MA5	Renaturation des berges et restauration des Usses aux points de contact des routes départementales (RD1508, RD992)	Initiée	CD74	I	2023	151 500,0 €	
MA6	Gestion des matériaux solides	Non engagée	Syr'Usses	I et F	2023	18 000,0 €	55 000,0 €
MA7	Diagnostic hydromorphologique des ruisseaux du Flon, Fornant et de la Léchère	Non engagée	Syr'Usses	I	2024	10 000,0 €	
MA8	Aménagement du Castran dans sa traversée de Frangy	Initiée	Syr'Usses	I	2024	20 835,0 €	
MA9	Aménagement et renaturation des Petites Usses dans le cadre d'une opération d'aménagement	Engagée	Syr'Usses, CCFU	I	2022	44 875,0 €	

● Restauration Plaine de Bonlieu :

- La maîtrise foncière par voie d'expropriation n'a pas encore permis de réactiver la Moe (prévision 2024)
- Maitrise Foncière composée :
 - Acquisitions foncières amiable
 - Signatures de 2 contrats d'Obligations Réelles Environnementales
 - Expropriations en cours : Jugements prononcés – Versement des indemnités – Syr'Usses prise de possession prochainement


AVANCEMENT DES ACTIONS

- Restauration Plaine de Bonlieu :
 - Réactivation de la MOE en 2024 : topo/géotech/ PRO/ DCE

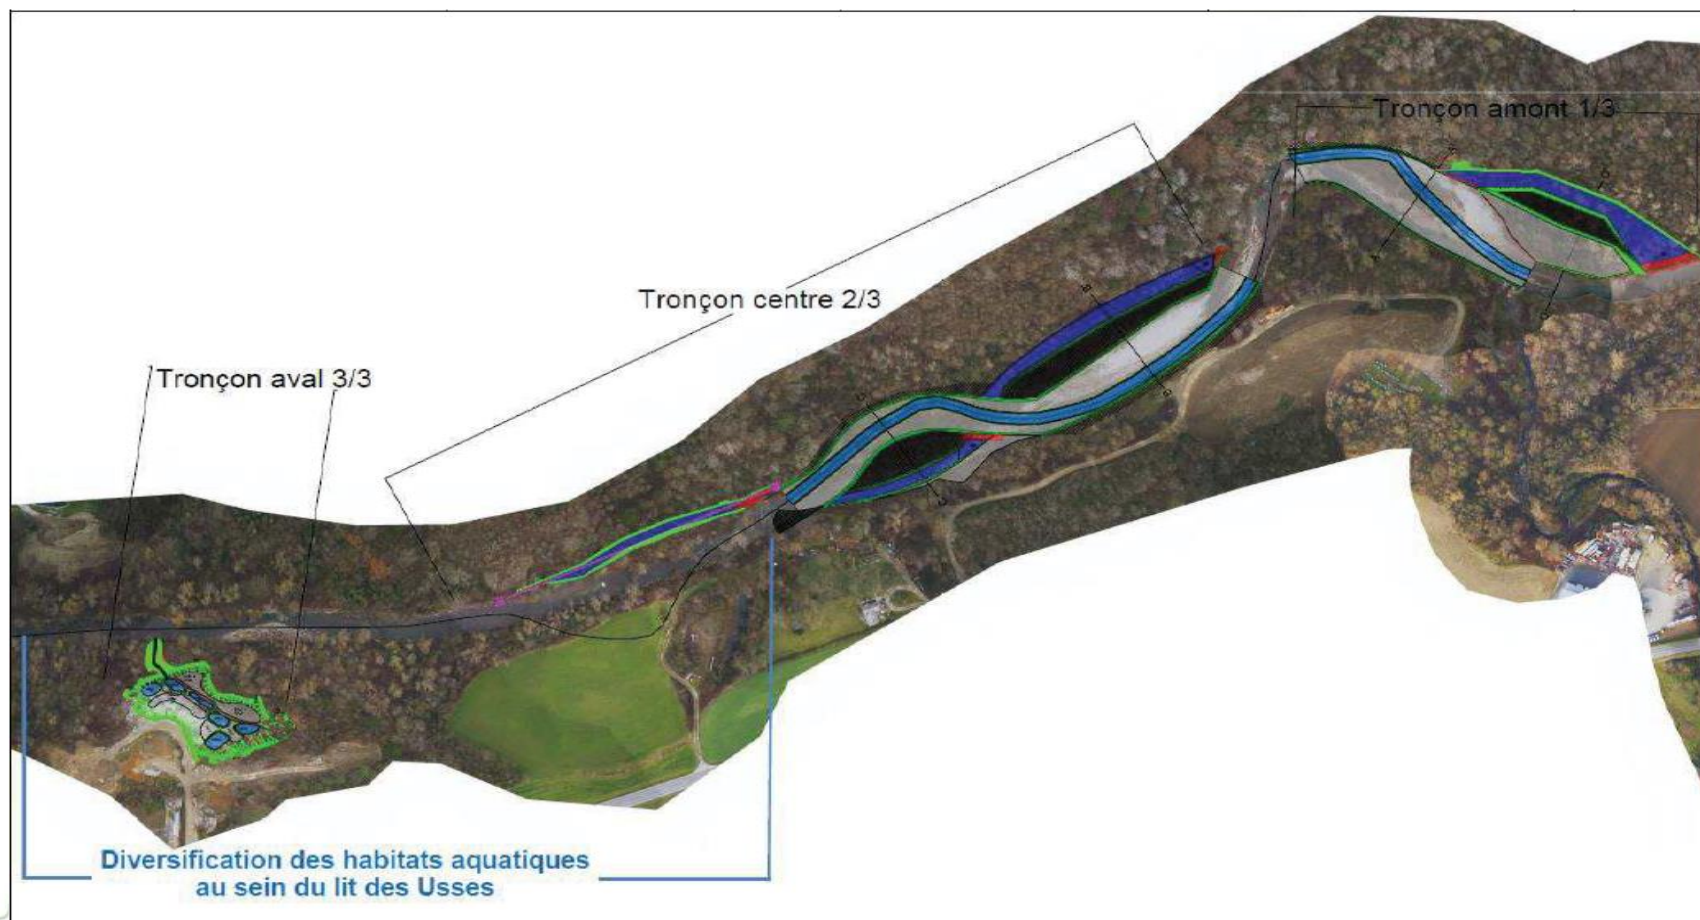

AVANCEMENT DES ACTIONS

- Renaturation des berges et restauration des Usses aux points de contact des RD :
 - Maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
 - 8 sites
 - Etude AVP en cours

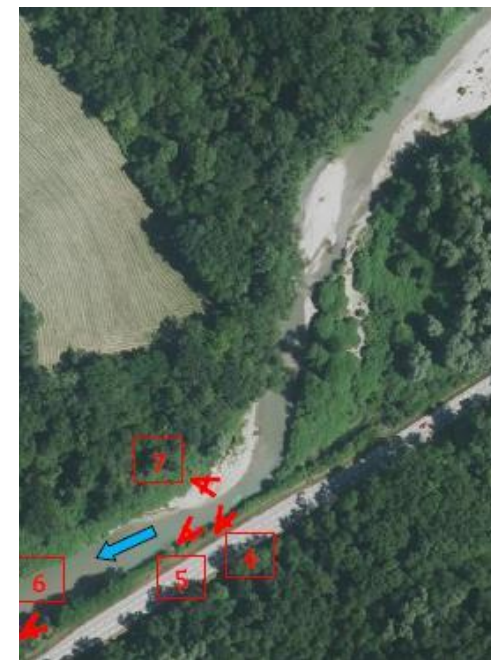

AVANCEMENT DES ACTIONS



N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA4	Restauration hydromorphologique de la Plaine de Bonlieu	Engagée	Syr'Ussees	I	2023	538 166,0 €	
MA5	Renaturation des berges et restauration des Ussees aux points de contact des routes départementales (RD1508, RD992)	Initiée	CD74	I	2023	151 500,0 €	
MA6	Gestion des matériaux solides	Non engagée	Syr'Ussees	I et F	2023	18 000,0 €	55 000,0 €
MA7	Diagnostic hydromorphologique des ruisseaux du Flon, Fornant et de la Léchère	Non engagée	Syr'Ussees	I	2024	10 000,0 €	
MA8	Aménagement du Castran dans sa traversée de Frangy	Initiée	Syr'Ussees	I	2024	20 835,0 €	
MA9	Aménagement et renaturation des Petites Ussees dans le cadre d'une opération d'aménagement	Engagée	Syr'Ussees, CCFU	I	2022	44 875,0 €	

● Aménagement du Castran :

- Porté à connaissance et rencontre des parties prenantes sur la partie amont
- Prévision du curage du pont par Frangy (cahier des charges /MOE)
- Rencontre des riverains



AVANCEMENT DES ACTIONS

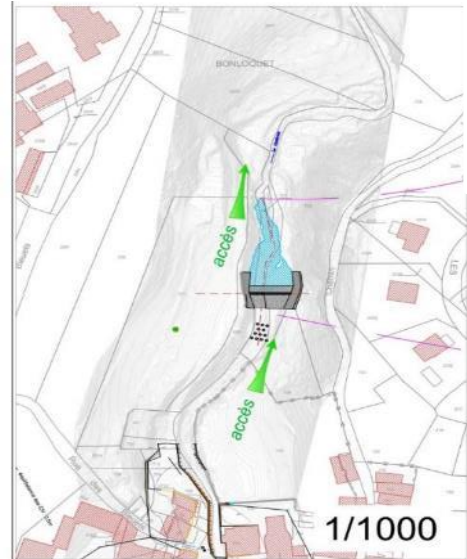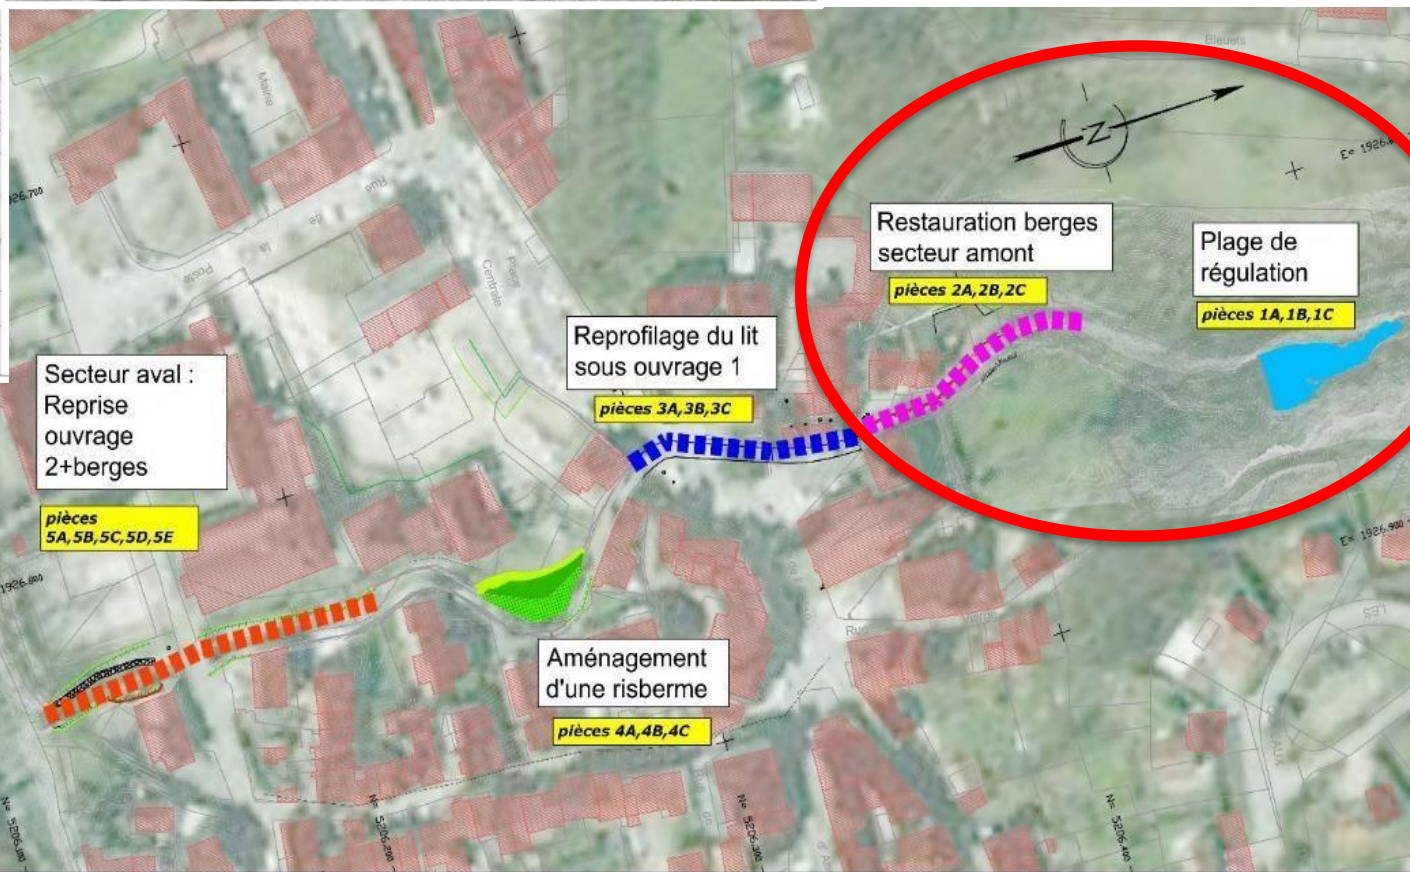

AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA4	Restauration hydromorphologique de la Plaine de Bonlieu	Engagée	Syr'Ussees	I	2023	538 166,0 €	
MA5	Renaturation des berges et restauration des Ussees aux points de contact des routes départementales (RD1508, RD992)	Initiée	CD74	I	2023	151 500,0 €	
MA6	Gestion des matériaux solides	Non engagée	Syr'Ussees	I et F	2023	18 000,0 €	55 000,0 €
MA7	Diagnostic hydromorphologique des ruisseaux du Flon, Fornant et de la Léchère	Non engagée	Syr'Ussees	I	2024	10 000,0 €	
MA8	Aménagement du Castran dans sa traversée de Frangy	Initiée	Syr'Ussees	I	2024	20 835,0 €	
MA9	Aménagement et renaturation des Petites Ussees dans le cadre d'une opération d'aménagement	Engagée	Syr'Ussees, CCFU	I	2022	44 875,0 €	

● Aménagement et renaturation des Petites Ussees:

- Réalisation et réception de l'étude AVP : étude hydraulique
- Montant de l'étude de 44 875 € TTC
- Validation du scénario n°6

AVANCEMENT DES ACTIONS:

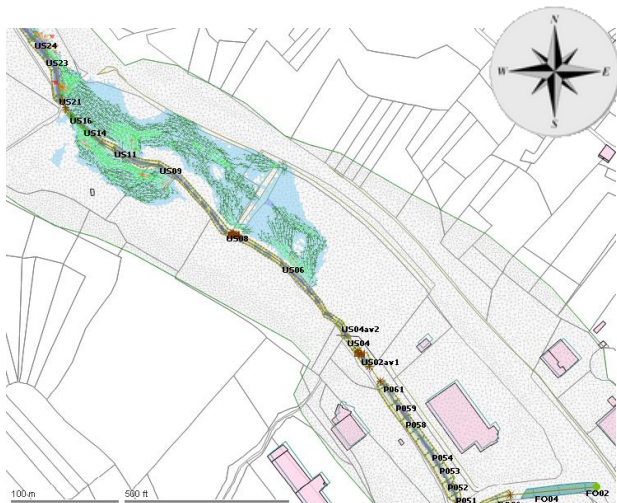


Figure 1 : Comparatif zone inondable Q10 pour l'état initial et l'état S6

LEGENDE
Hauteur d'eau(m) Vitesse écoult.(m)

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| ▲ (light blue) | >= 0.01 | ▲ (light green) | >= 0.1 |
| ▲ (medium blue) | >= 0.5 | ▲ (medium green) | >= 0.25 |
| ▲ (dark blue) | >= 1.0 | ▲ (dark green) | >= 0.5 |
| | | ▲ (orange) | >= 1.0 |
| | | ▲ (red) | >= 2.0 |



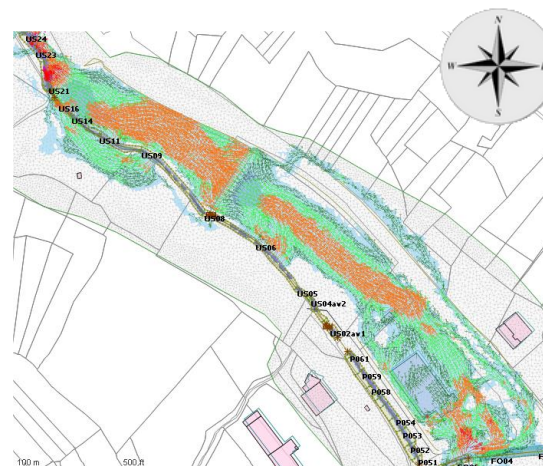


Figure 1 : Comparatif zone inondable Q100 amont pour l'état initial et l'état S6



LEGENDE
Hauteur d'eau(m) Vitesse écoult.

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| ▲ (light blue) | >= 0.01 | ▲ (light green) | >= 0.1 |
| ▲ (medium blue) | >= 0.5 | ▲ (medium green) | >= 0.25 |
| ▲ (dark blue) | >= 1.0 | ▲ (dark green) | >= 0.5 |
| | | ▲ (orange) | >= 1.0 |
| | | ▲ (red) | >= 2.0 |

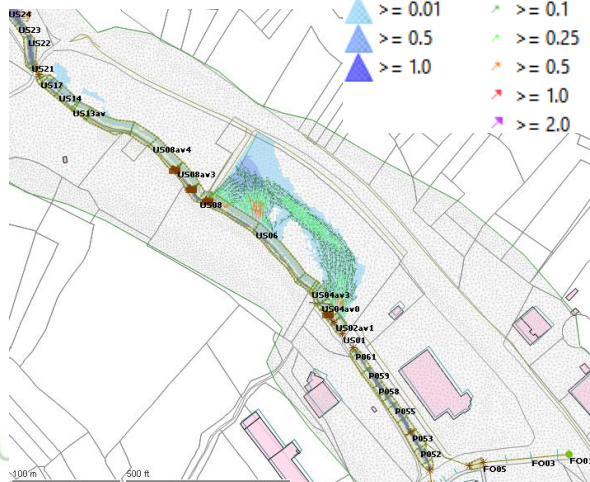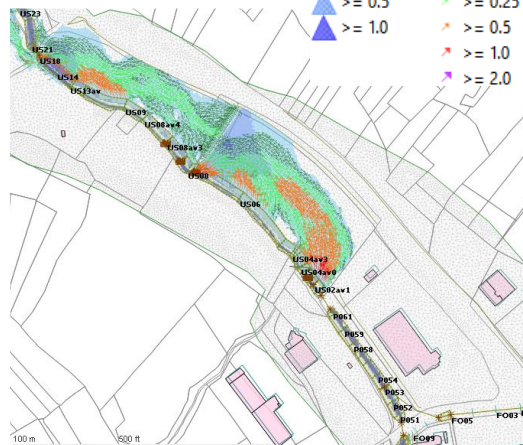

AVANCEMENT DES ACTIONS

Scénario 6

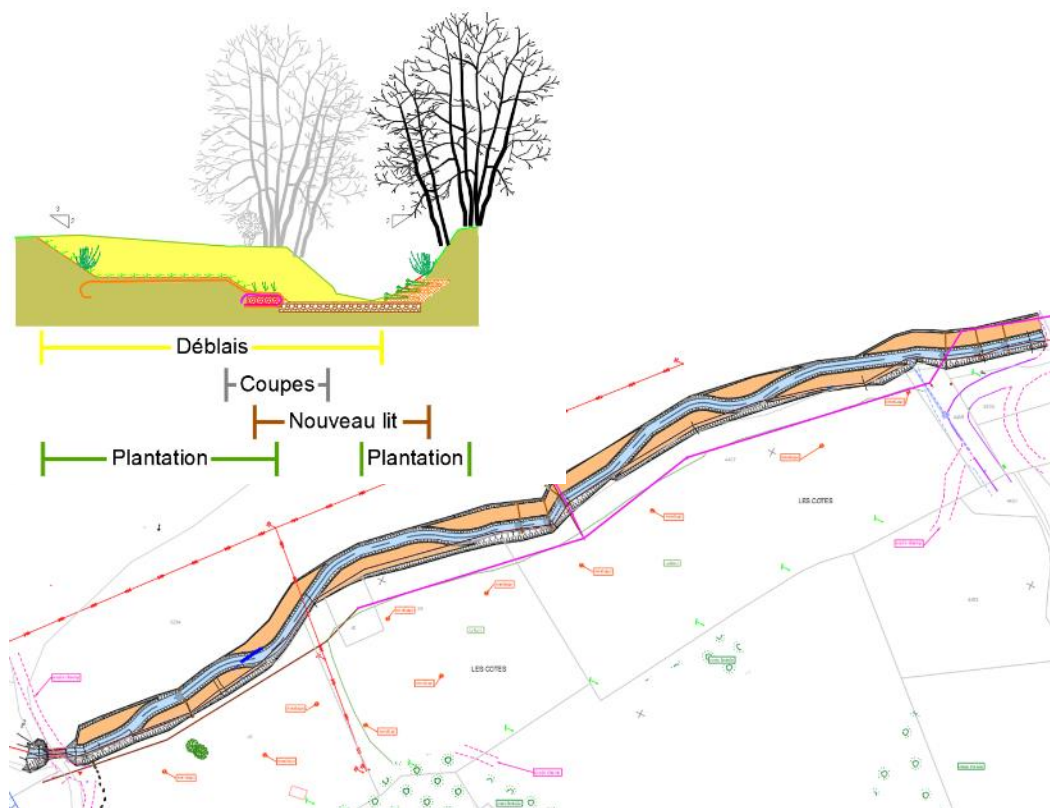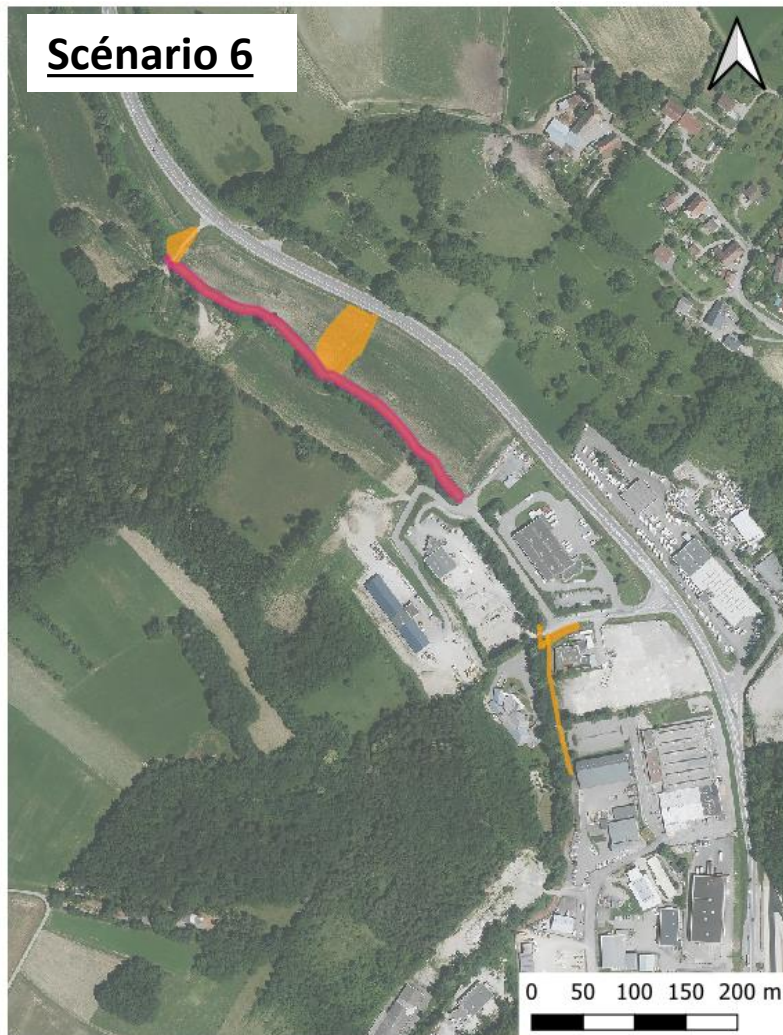

Coût prévisionnel à 676 786 € HT

*Intervention de
M. Noël DE BERNARDO,
Responsable Pôle Technique*

*Communauté de Communes
Fier et Usses*

Les Usses
SYNDICAT
DE RIVIÈRES



AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA10	Suivis des peuplements piscicoles et astacicoles	Engagée	FDPPMA, Syr'Ussees	F	2022		55 560,0 €
MA11	Aménagement du Castran pour restaurer la continuité écologique (ROE 24 385 et ROE 24 386)	Initiée	Syr'Ussees	I	2023	173 500,0 €	
MA12	Restauration de la continuité écologique sur les Ussees (ROE 55753 Chez les Gays) et sur les Petites Ussees (ROE24397) et diagnostic de l'ouvrage de traversée de la RD1508 sur les Petites Ussees (ROE 55961)	Non engagée	Syr'Ussees délégation du CD74	I	2023	50 000,0 €	
MA13	Etude de faisabilité - restauration de la continuité écologique du Fornant (dont ROE 24 396)	Initiée	Frangy	I	2023	24 000,0 €	

● Suivis des peuplements piscicoles et astacicoles :

- Prospection sur linéaires de cours d'eau à présence d'écrevisses autochtones
- Résultats:
 - Ruisseau du Cernex: peste des écrevisses
 - Ruisseau du Marsin: recolonisation du linéaire



FDPPMA 74

AVANCEMENT DES ACTIONS


N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA10	Suivis des peuplements piscicoles et astacicoles	Engagée	FDPPMA, Syr'Ussees	F	2022		55 560,0 €
MA11	Aménagement du Castran pour restaurer la continuité écologique (ROE 24 385 et ROE 24 386)	Initiée	Syr'Ussees	I	2023	173 500,0 €	
MA12	Restauration de la continuité écologique sur les Ussees (ROE 55753 Chez les Gays) et sur les Petites Ussees (ROE24397) et diagnostic de l'ouvrage de traversée de la RD1508 sur les Petites Ussees (ROE 55961)	Non engagée	Syr'Ussees délégation du CD74	I	2023	50 000,0 €	
MA13	Etude de faisabilité - restauration de la continuité écologique du Fornant (dont ROE 24 396)	Initiée	Frangy	I	2023	24 000,0 €	

● Etude de faisabilité – restauration de la continuité du Fornant :

- Rédaction du cahier des charges volet continuité porté par le Syr'Ussees et volet eau potable porté par Frangy
- Consultation et attribution en cours

AVANCEMENT DES ACTIONS

- Etude de faisabilité – restauration de la continuité du Fornant :

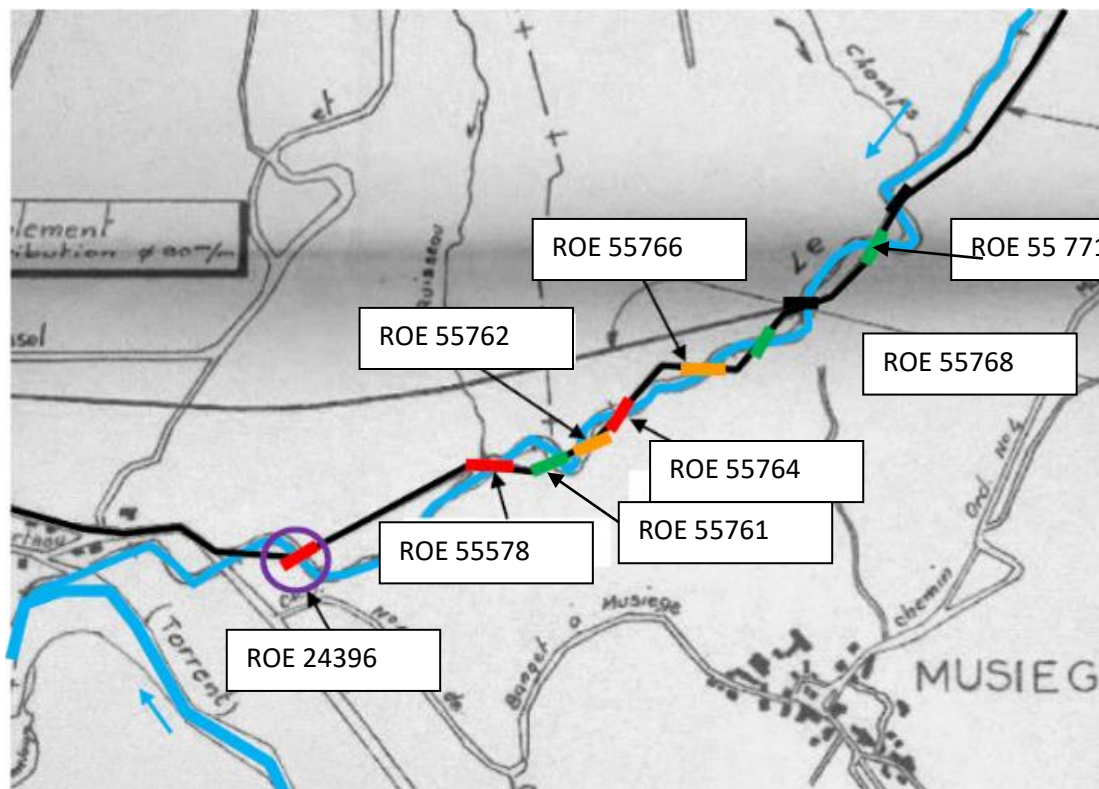

AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Usses	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA14	Entretien du Marais des Mouilles (le Sappey) et Restauration de la Caille centre (Allonzier la Caille)	Engagée	Syr'Usses	I et F	2022	19 125,0 €	17 580,0 €
MA15	Entretien des marais Clef des faux et Nantafond (Choisy)	Engagée	Syr'Usses	F	2023		10 644,0 €
MA16	Mise en œuvre de la notice de gestion de Bovinens les Dérenches - Usinens	Initiée	Syr'Usses	I	2023	8 766,0 €	
MA17	Mise en œuvre de la notice de gestion du marais de Challonges - Challonges	Initiée	Syr'Usses	I	2024	19 107,3 €	
MA18	Etude de faisabilité Marais de Mercanton (Groisy)	Initiée	Syr'Usses	I	2024	15 000,0 €	
MA19	Mise en œuvre de la notice de gestion pour Marais Tirnan et Vorziers (Vanzy)	Engagée	Syr'Usses	I	2022	12 670,0 €	
MA20	Diagnostic écologique et hydrologique et propositions de scénarii de restauration - ZH Seysse	Terminée	Syr'Usses	I	2022	59 028,0 €	

Entretien du Marais des Mouilles (Le Sappey)

Renouvellement des conventions d'usage ; arrachage des invasives ; restauration puis entretien de la partie est ; suivis des espèces patrimoniales ; recherche de pieds de sanguisorbe officinale

- Travaux : 0,59 ha
- Dépenses : 4 425,80 € TTC



AVANCEMENT DES ACTIONS

● Bilan de la restauration de la Caille Centre

- Arrachage des invasives ; restauration de la prairie centrale ; travaux hydrauliques, suivis (faune/flore/habitats, hydrologique), évaluation du plan de gestion 2018–2022 et rédaction du plan de gestion 2023–2027
- Travaux : 0,2 ha
- Dépenses (2018–2023) : 34 073,61 € TTC
- Poursuite des actions jusqu'en 2027 (phase d'entretien), en partenariat avec la commune et la CCPC



AVANCEMENT DES ACTIONS

● Entretien des Marais Clef des Faux et Nantafond (Choisy)

- Arrachage des invasives (Entreprise COLAS), réouverture de milieux (bucheronnage et broyage avec exportation)
- Travaux : 1,1 ha
- Dépenses (2023) : 4 663,20 € TTC



AVANCEMENT DES ACTIONS


● Restauration de la ZH Bovinens (Usinens)

- Signature de conventions d'usage, animation partenariale (commune, agriculteurs), fauche des invasives, débroussaillage et réouverture du milieu (reporté début 2024)
- 0,03 ha
- Dépenses (2023) : 550 € TTC




● Restauration du marais de Challonges

- Animation partenariale (commune / ACCA / RTE) et foncière → Manque encore l'accord d'un propriétaire pour pouvoir réaliser les travaux de restauration hydraulique
- Actualisation de la cartographie d'habitats et des contours du site, recherche des espèces patrimoniales historiques

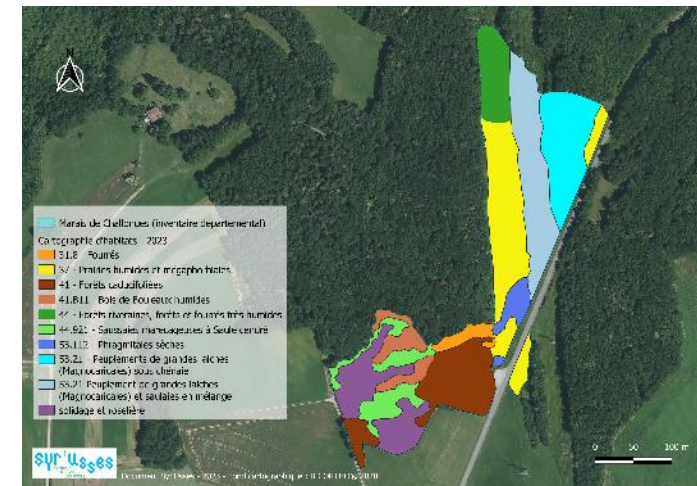

AVANCEMENT DES ACTIONS

- **Restauration Marais des Vorziers (Vanzoy)**
 - Animation foncière, fauche des invasives, débroussaillage et réouverture du milieu (reporté début 2024), suivi des espèces patrimoniales
 - 0,85 ha
 - Dépenses (2023) : 3 480 € TTC

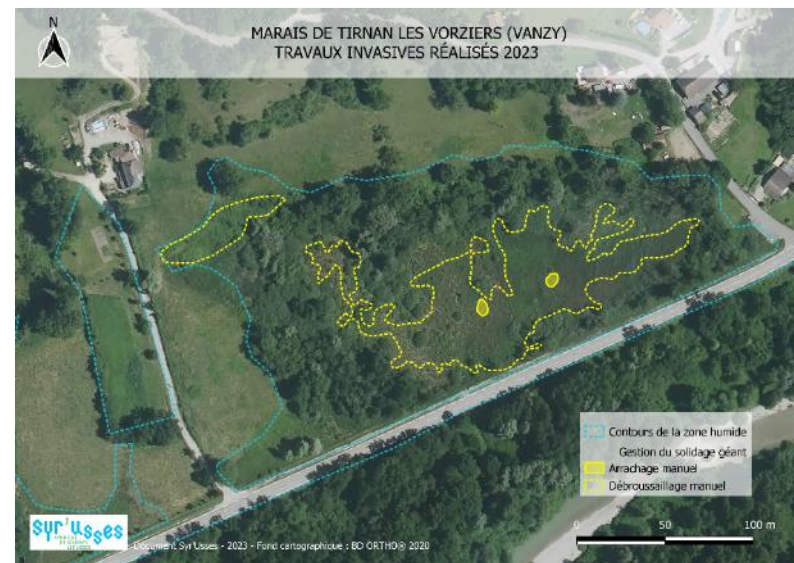

Débroussaillage du solidage géant, été 2023




Agrion de mercure, mai 2023

AVANCEMENT DES ACTIONS

Zone Humide de Seyssel : Diagnostic écologique, hydrologique, scénarii de restauration

- ZH de 3,5 ha
- Rendu des études finales : diagnostic (écologique, hydrogéologique, topographie) et propositions de scénarii
- Scénario retenu : obstruction des dalots OH6 et 7 (entrées d'eau aval sous RD), réhausse du fil d'eau de l'OH10 (sortie), comblement chenal aval (si besoin), suivis
- Montant total de l'étude : 44 612,50 € HT

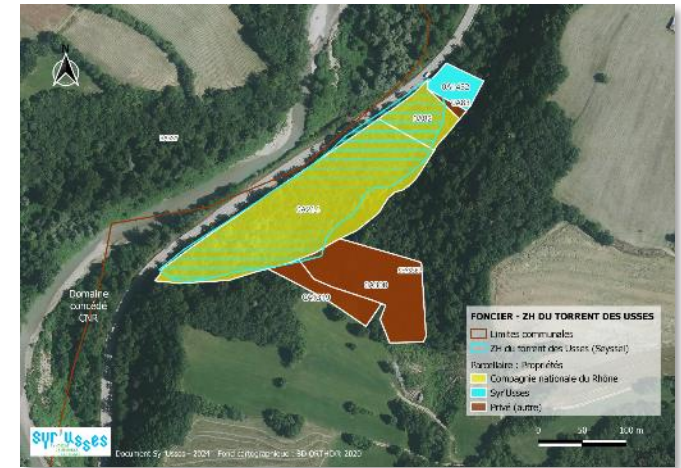

Comblement de l'aval de la zone humide par des fines en provenance des UsseS





AVANCEMENT DES ACTIONS – FOCUS CTENS

Entretien des zones humides du Plateau des Bornes – Bassin versant des UsseS

Amont du Bassin versant des UsseS sur 6 communes

- 10 zones humides donc 5 majeurs pour les enjeux liés à l'eau et qui représentent près de 32 ha de surface sur le Plateau des Bornes
- Les opérations d'entretien des zones humides du Plateau des Bornes ont comptabilisé un reste à charge de 7 400 € pour le Syr'UsseS, pour une enveloppe de travaux de 21 000 € TTC déduction des subventions du Conseil Départemental

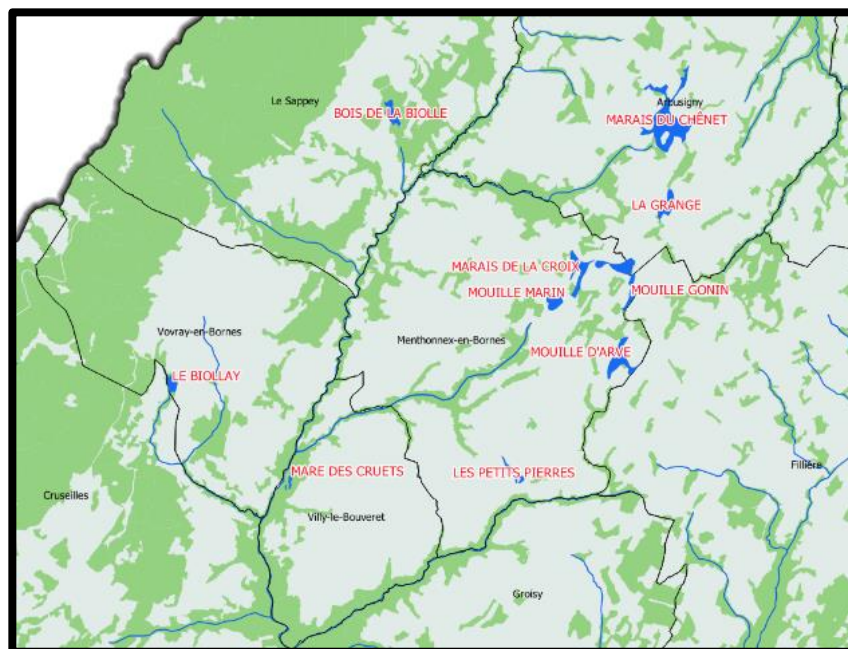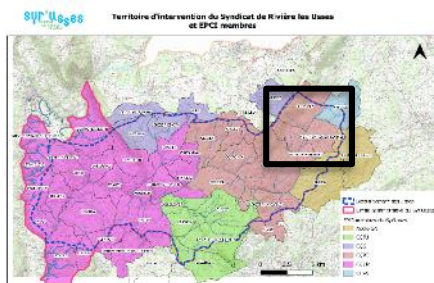

AVANCEMENT DES ACTIONS – FOCUS CTENS

● Restauration des zones humides du Plateau des Bornes – Bassin versant des UsseS

5 zones humides ont bénéficié de travaux d'entretien (Marais de la Croix-Le Biollay- Marais du Chenet – Mouille Gonin – Mouille d'Arve)

Travaux d'entretien (annuel ou bisannuel):

- Arrachage et débroussaillage d'invasives
- Broyage avec exportation
- Fauche
- Nettoyage et recreusement de mare

Etude et suivi des zones humides :

- Rapport piézométrique annuel



*Intervention de
M. Antoine AMOUREUX,
Chargé de mission
environnement*

**COMPAGNIE NATIONALE DU
RHONE**

Les Ussees
SYNDICAT
DE RIVIÈRES



PAUSE

Les Ussees
SYNDICAT
DE RIVIÈRES



AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Usses	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
MA21	Aménagement de zones d'abreuvement sur les ruisseaux à écrevisses patrimoniales	Engagée	Syr'Usses	I	2023	30 000,0 €	
MA22	Gestion des boisements de berges	Engagée	Syr'Usses	I et F	2022	30 000,0 €	100 000,0 €
MA23	Plan de lutte contre les espèces invasives - volet faune : Pose de système antifranchissement pour les écrevisses invasives (<i>Pacifastacus leniusculus</i>)	Engagée	Syr'Usses	I	2022	13 750,0 €	
MA24	Plan de lutte contre les espèces invasives - volet flore : Actions de lutte sur trois secteurs prioritaires	Engagée	Syr'Usses	I et F	2022	15 000,0 €	100 000,0 €
MA AR1	Diagnostic et restauration des boisements de berges - affluents du Rhône de la CCUR	Initiée	Syr'Usses délégation de la CCUR	I	2024	45 267,0 €	
MA AR2	Réalisation et mise en place d'un plan de lutte contre les invasives sur les affluents du Rhône de la CCUR	Initiée	Syr'Usses délégation de la CCUR	F	2023		30 000,0 €

● Aménagement de zones d'abreuvement:

- Concertation avec l'exploitant sur le ruisseau des Chenêts
- Signature des conventions en cours
- Terrain et diagnostic réalisés pour le ruisseau du Vengeur

Ruisseau des Chenêts

LOCALISATION DES TRAVAUX
Commune de Sallenôves


Mise en défend du Ruisseau
+ reprise de la berge

Prise d'eau hors cours d'eau

Prise d'eau Seuil
pour Abreuvoir

Mise en défend du Ruisseau (Clôtures)

Prise d'eau hors cours d'eau

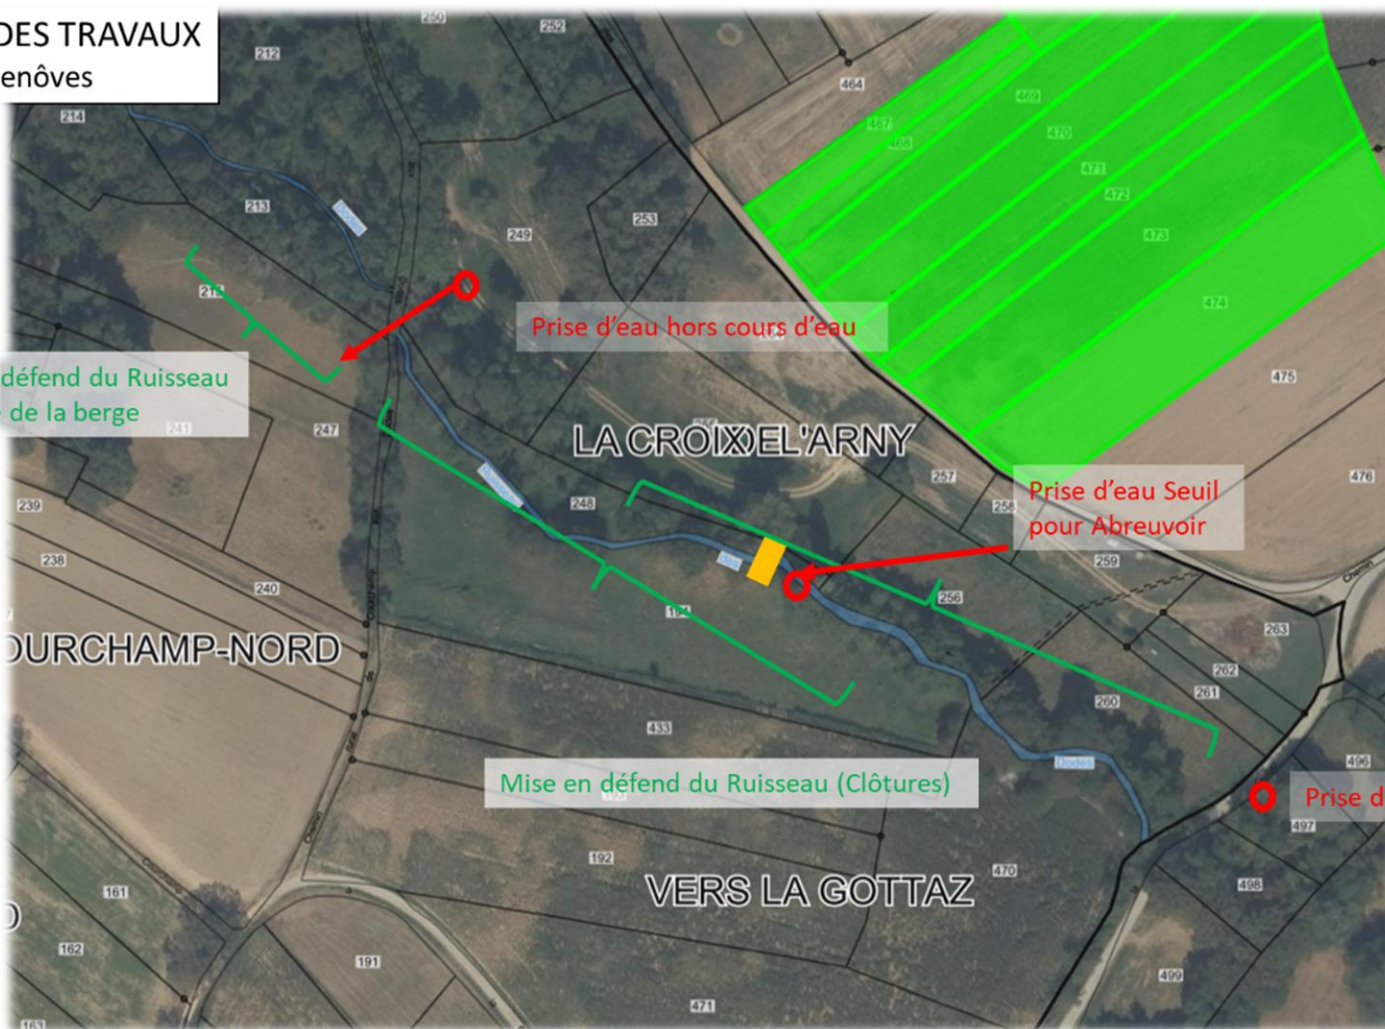

ETAT ACTUEL EN RIVE DROITE :



- 1 source captée alimentant un abreuvoir en rive droite du ruisseau
- Présence d'un trop plein retournant au milieu
- Présence d'un passage à gué pour faire traverser les animaux
> impacts sur le milieu, berges détruites
- Colmatage du lit



Regard en béton perforé = *crépine*
avec un bidim glissé à l'intérieur
pour filtrer les fines

Seuil en bois h < 30 cm pour faire
une réserve d'eau au niveau de la crépine

PEHD prenant l'eau dans le regard et alimentant
le bac d'abreuvoir
en aval par gravité



AVANCEMENT DES ACTIONS

- Gestion des boisements de berges
 - 5 867ml ont été traités, pour un montant total de dépense de 18 564 € TTC
 - Depuis 2022, 14 063 ml ont été traités pour un montant engagé de 25 394 € TTC
- Gestion des boisements de berges lors de la tempête du 24 juillet 2023



AVANCEMENT DES ACTIONS

● Gestion des boisements de berges : exemple du verrou de Serrasson (Musièges)



AVANCEMENT DES ACTIONS

- Gestion des boisements de berges Mise à jour du plan de gestion et renouvellement de la Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.)
 - Phase Terrain (2022–2024) Boisements Berges – Transport Solides
 - Phase de rédaction (2024)
 - Recrutement d'un bureau d'études pour rédiger la partie réglementaire de la DIG
 - Enquête Publique
 - Arrêté 2025 ? Pour une durée de 5 ans ?

AVANCEMENT DES ACTIONS



- Plan de lutte contre les espèces invasives – volet faune : Pose de système antifranchissement pour les écrevisses invasives (*Pacifastacus leniusculus*)

- Pourquoi?



- 6 plaques ont été installées et 1 piège posé pour un montant total de 5 640 € HT




AVANCEMENT DES ACTIONS

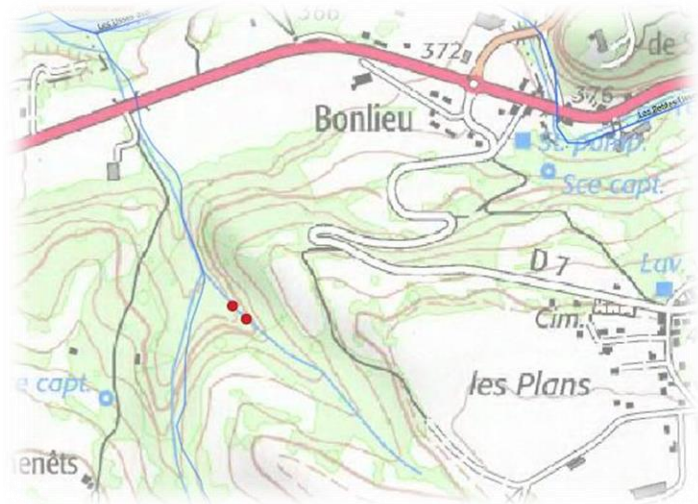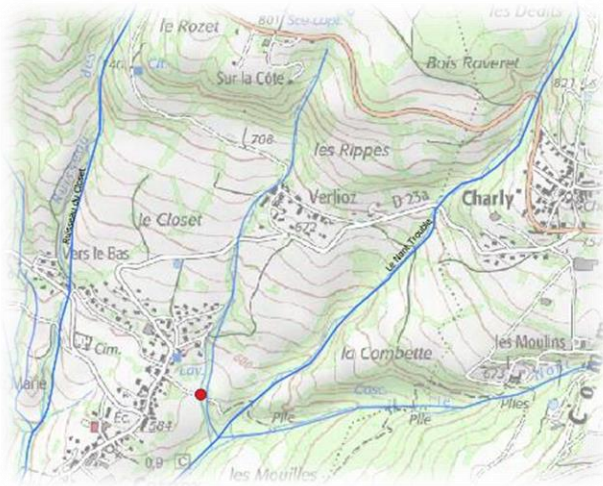

AVANCEMENT DES ACTIONS

Plan de lutte contre les espèces invasives – volet flore : Actions sur trois secteurs prioritaires

- Trois secteurs Prioritaires (BV Fornant, Petites UsseS amont, amont UsseS)

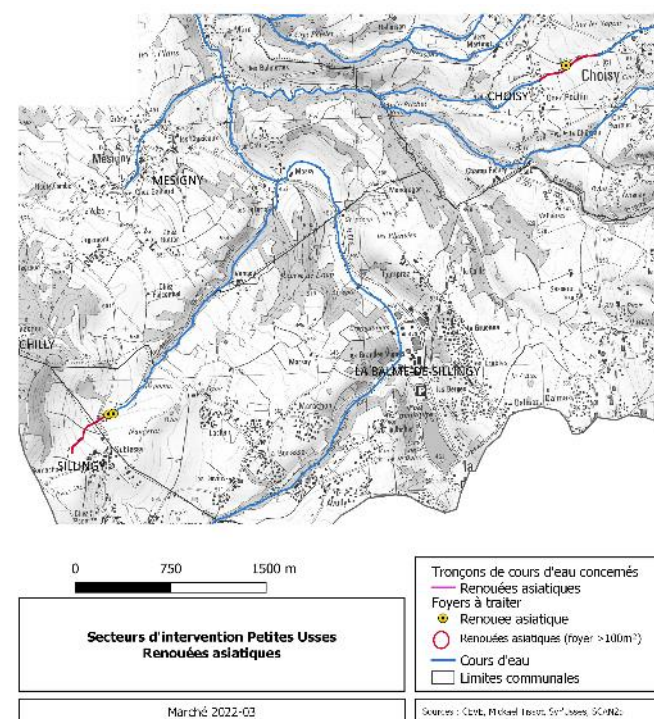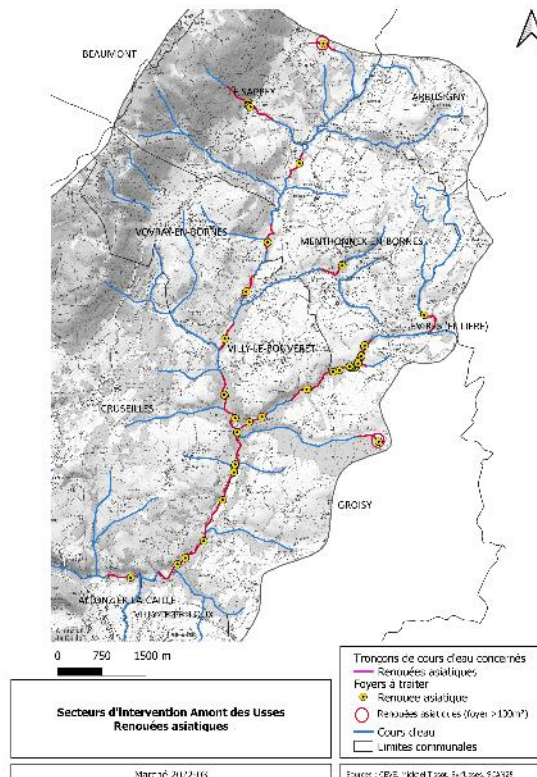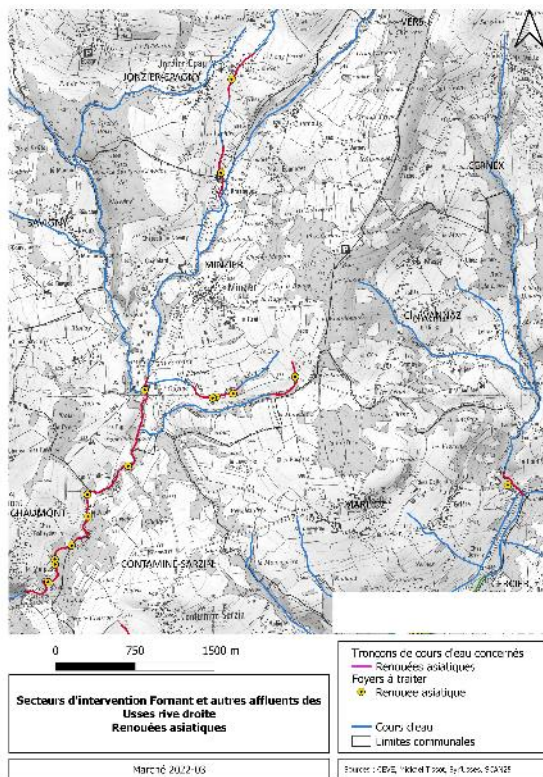

AVANCEMENT DES ACTIONS

Plan de lutte contre les espèces invasives – volet flore : Actions sur trois secteurs prioritaires


- Liste des espèces traitées depuis 2022, pour un montant total de 59 143 € TTC

	Nbre Massifs	Surface (m2)	Technique
Renouée	70	2 367	Fauche/arrachage et Export
Balsamine		7 824	Fauche et dessouchage manuel
Buddleia	165	400	Fauche et dessouchage manuel
Grand Berce	9	9	Fauche et export
Raisin Amérique	1	1	Arrachage
Solidage		3 530	Fauche



AVANCEMENT DES ACTIONS

Affluents du Rhône – Boisement de berges et Lutte contre les invasives

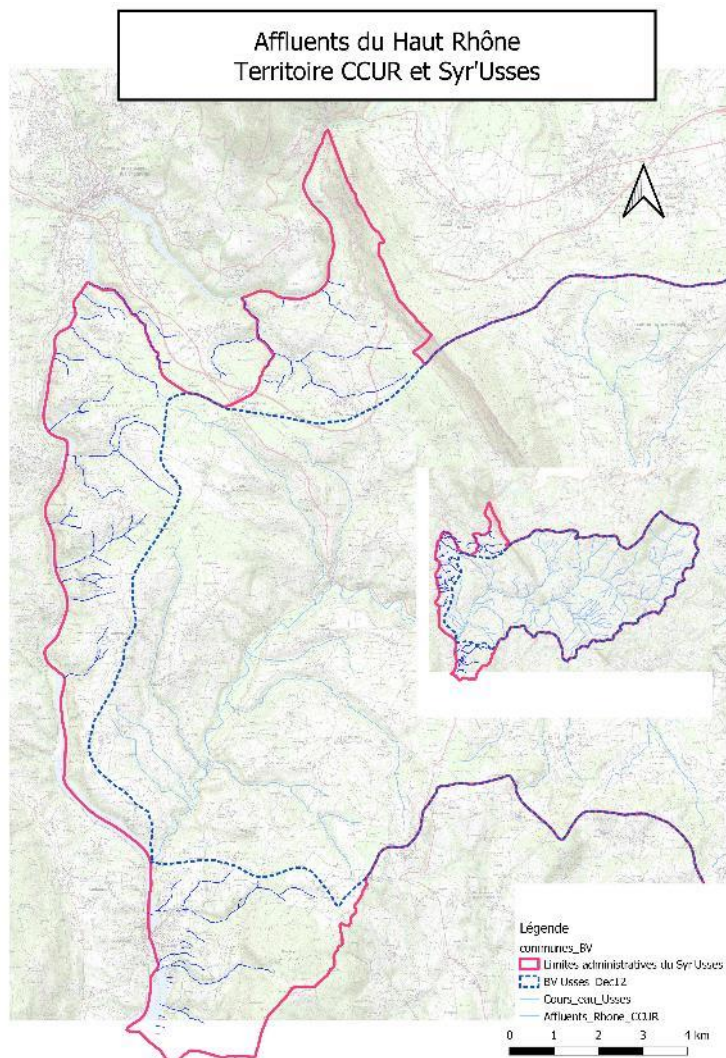

Diagnostic de terrain :

- Ruisseaux du Trainan et du Parnant
- Ruisseau de la Morte
- Grand Nant

Avancées des actions
du Contrat de Milieux

-

Volet Risque
Inondation & Qualité

Les Ussees
SYNDICAT
DE RIVIÈRES



AVANCEMENT DES ACTIONS

- Un total de 398 844 € de montant d'action prévisionnel
- 150 922 € d'aide prévisionnelle de l'agence de l'eau
- 30 200 € d'aide prévisionnelle du Conseil Département




N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
R11	Modélisation Q100 et recensement des zones à risque d'inondation et de ruissellement	Non engagée	Syr'Ussees	F	2023		25 000,0 €
QL1	Suivi annuel des stations et points jugés prioritaires (prolifération végétale, rejets STEP, physico-chimie) sur le bassin versant et les affluents du Rhône	Engagée	Syr'Ussees	F	2022		301 844,0 €
QL2	Amélioration des traitements des stations d'épuration de Jonzier-Epagny et Savigny	Initiée	CCG	I	2022	72 000,0 €	

Volet Inondation (1 action)		
Non engagée	1	100%
Volet Qualité (2 actions)		
Initiée	1	50%
Engagée	1	50%

AVANCEMENT DES ACTIONS

- Suivi annuel des stations et points jugés prioritaires (prolifération végétale, rejets STEP, physico-chimie) sur le bassin versant
 - Outil de partage d'information et de données
 - Défini un état des lieux et permet de suivre l'évolution de la situation des eaux et milieux
 - Depuis 2020, le montant total engagé dans l'observatoire Qualité des eaux est de **484 940,71€ TTC**
 - 2022 : 32 stations suivies, 5 stations en bon état, 23 stations en état moyen, 3 en état dégradé
 - 2023 : présentation des résultats prochainement

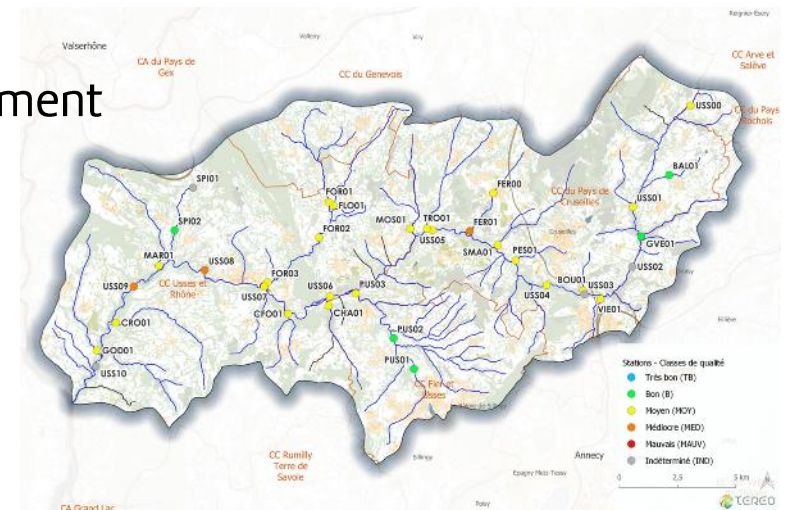

Observatoire de la qualité des eaux du bassin versant des Ussees
Etat écologique 2022

*Intervention de
M. Franck PERRIN
Directeur Adjoint
Régie des eaux*

*Communauté de Communes
du Genevois*

Les Usse
SYNDICAT
DE RIVIÈRES



Avancées des actions
du Contrat de Milieux

-

Volet Communication
& Sensibilisation




AVANCEMENT DES ACTIONS

- Un total de 136 038 € de montant d'action prévisionnel
- 88 675 € d'aide prévisionnelle de l'agence de l'eau



Volet Sensibilisation (8 actions)

Volet Sensibilisation (8 actions)		
Non engagée	2	25%
Initiée	1	13%
Engagée	5	63%

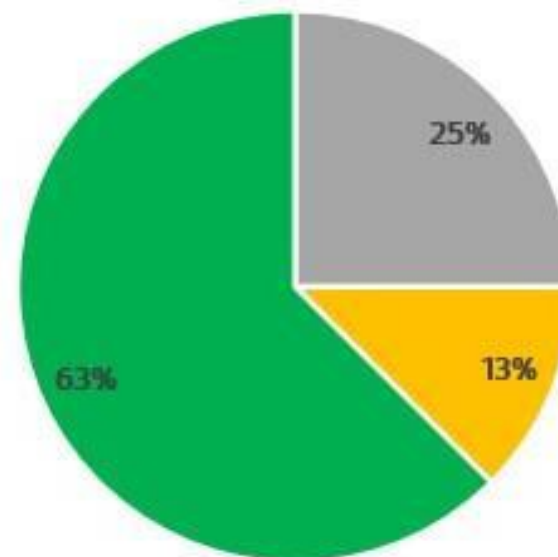

■ Non engagée ■ Initiée ■ Engagée

AVANCEMENT DES ACTIONS

N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Ussees	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
SE1	Développer et faire vivre des outils pour faire connaître le Syndicat, ses actions, ses missions, participer à des manifestations, etc.	Engagée	Syr'Ussees	F	2022		18 595,0 €
SE2	Expériences de nature : sortie, médiation, etc. sur les thèmes de l'eau, des milieux, des espèces	Engagée	Syr'Ussees	F	2023		18 541,0 €
SE3	Créer et développer les dispositifs scolaires et d'enseignement secondaire et supérieur (classes d'eau des Ussees, partenariats avec des établissements, etc.)	Engagée	Syr'Ussees	F	2023		41 031,0 €
SE4	Créer et développer des outils pour les socio-professionnels et collectivités (BTP, agriculteurs, industriels, etc.) sur la préservation des milieux	Engagée	Syr'Ussees	F	2023		4 378,3 €
SE5	Mise en valeur de la rivière par le vélo	Non engagée	Syr'Ussees	I	2024	16 378,0 €	
SE6	Renforcer la collaboration avec les services publics de l'eau et plus largement les collectivités	Engagée	Syr'Ussees	F	2022		9 340,0 €
SE7	Fédération du territoire autour des enjeux liés à l'eau : Exposition photo itinérante	Initiée	Syr'Ussees	F	2023		18 676,0 €
SE8	Cycle de formation pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes (flore)	Non engagée	Syr'Ussees	F	2024		9 099,0 €

🟢 Toutes actions de communication / sensibilisation confondues

Le montant total des dépenses s'élèvent, de janvier 2022 à décembre 2023, à 28 015,64 € TTC

AVANCEMENT DES ACTIONS

AGISSONS CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

1 CONSTATER

Les indices d'une pollution :

- Odeurs,
- couleurs,
- poissons morts.

2 ALERER LES SAPEURS-POMPIERS

Appeler les sapeurs-pompiers en composant le 18. Mentionner :

- La date et l'heure du constat,
- Le lieu précis (adresse, commune et cours d'eau concerné),
- Les éléments constatés (odeur, couleur, étendue de la pollution),
- L'origine possible (eaux usées, pluviales, déversement direct...),
- Vos coordonnées.

3 INFORMER LE SYR'USSES

Contactez le Syr'Usse par téléphone au 04 50 20 05 05 ou à l'adresse contact@syrivieres-usses.com en mentionnant les informations ci-dessus.



Syr'Usse

04 50 20 05 05
04 50 20 05 05
www.syrivieres-usses.com

Etat écologique des cours d'eau de la communauté de communes Pays de Cruseilles



Syr'Usse

Syndicat de Rivières les Usse, 307 Tron de l'Église - 74 130 BRAYOTTE
04 50 20 05 05 - www.syrivieres-usses.com

Syr'Usse **SÉCHERESSE** Dans les Usse **PARIS**

LES BONNES GESTES !

ALERTE RENFORCÉE NIVEAU 3/4

<p>ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : RÉDUISÉZ DE 50% LES VOLUMES D'EAU</p>	<p>LES FONTAINES PUBLIQUES ET PRIVÉES EN CIRCUIT OUVERT DOIVENT ÊTRE FERMÉES</p>	<p>ARROSEZ VOTRE JARDIN ENTRE 20H ET 8H EN PRIVILÉGIANT LA RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE</p>
<p>NE PRÉLEVEZ PAS D'EAU DIRECTEMENT DANS LE COURS D'EAU ET LES NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT</p>	<p>NE REMPLISSEZ OU VIDANGEZ PAS VOTRE PISCINE PRIVÉE</p>	
<p>NE NETTOYEZ PAS VOTRE FAÇADE, TERRASSE, PARKING OU TOITURE</p>	<p>NE LAVEZ PAS VOTRE VÉHICULE HORS STATIONS PROFESSIONNELLES</p>	<p>INSTALLEZ DES ÉQUIPEMENTS ÉCONOMES EN EAU</p>

Le logo bonnet de l'emploi professionnel (BONNET) est, à partir du 1er septembre 2022, un dispositif de lutte contre les juges de paix. Il est à réserver à l'usage de la justice. Le logo de la justice est à réserver à l'usage de la justice. Le logo de la justice est à réserver à l'usage de la justice.

Syr'Usse
SYNDICAT DE RIVIÈRES LES USSES

AMÉLIORER la qualité de l'eau

Communauté de Communes Pays de Cruseilles

Suivi de la qualité des eaux du bassin versant des Usse

Résultats campagne 2022

juillet 2023

Les Usse
SYNDICAT DE RIVIÈRES

Papyr'Usse

Une Rivière, des Hommes, un Territoire

Syr'Usse
SYNDICAT DE RIVIÈRES LES USSES

Eau et agriculture

Zoom sur l'activité agricole du bassin versant des Usse

Le magazine du Syndicat de Rivières n°11 Octobre 2023



AVANCEMENT DES ACTIONS

PGRE **Météo des UsseS**
14 mars 2023

Pluie et redoux : les conditions sont optimales pour la migration des grenouilles rouges. Les premières pontes sont déjà visibles dans les mares de la forêt alluviale qui bordent la partie aval des UsseS.




PGRE **Bulletin d'information des UsseS**
5 décembre 2023

Les UsseS sont en crue !

Trois crues quinquennales ont eu lieu en un mois sur le bassin versant des UsseS (crue qui a une chance sur 5 de se produire chaque année).
Crue biennale : 75 m³/s
Crue quinquennale : 110 m³/s

Date	Débit pointe
25/10/2023	82 m ³ /s
27/10/2023	79 m ³ /s
02/11/2023	113 m ³ /s
04/11/2023	85.5 m ³ /s
30/11/2023	118 m ³ /s
01/12/2023	112 m ³ /s



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !



[Synr'UsseS, Syndicat de Rivières Les UsseS](#)

458 followers 115 publications en 2023



● Conférences

- 28 avril : Conférence de l'eau à Bassy
- 01 juin : Conférence zones humide avec le Pays Rochois

● Evènements

- 1&2 juillet : Fête des Fromages
- 20 octobre : Forum des Collectivités

AVANCEMENT DES ACTIONS



● Journées collectives de formation / sensibilisation

- 12 mai : MFR des Dronières ; 25 élèves de BAC PRO CGEA sur la préservation des zones humides
- 16 juin : Journée RSE de l'entreprise COLAS sur la lutte contre les invasives ; 80 personnes

AVANCEMENT DES ACTIONS



● Le 15 février

- En partenariat avec Grand Annecy
- Zone Humide de Mercanton
- 10aine de personnes



● Le 16 septembre

- Rand'eau autour de Cruseilles
- 6 personnes




● Le 27 octobre

- Halloween aux Dronières
- 40 personnes

AVANCEMENT DES ACTIONS

Dispositif des Classes d'eau

- Durant l'année scolaire 2022-2023, 8 classes du CE1 au CM2 de 3 écoles différentes ont bénéficié du dispositif (environ 170 élèves)
- Il s'agissait des écoles de Desingy, Chilly et Vovray en Bornes

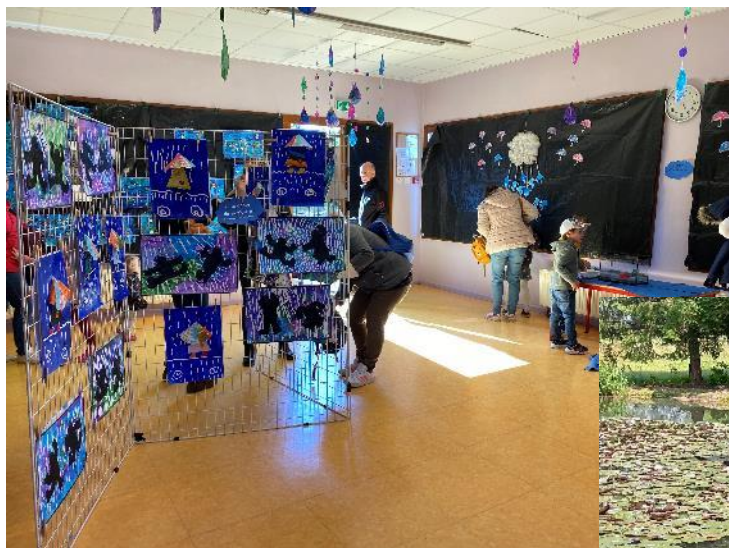

*Intervention de
Mme Jacqueline CECCON*

*VP Syr'Usses en charge de la
communication et de la
participation citoyenne*



Avancées des actions
du Contrat de Milieux

-

Volet Pilotage et
Gouvernance



AVANCEMENT DES ACTIONS

- Un total de 513 089 € de montant d'action prévisionnel
- 256 544 € d'aide prévisionnelle de l'agence de l'eau



N° de l'Action	Intitulé de l'action	Avancement Actions	Syr'Usses	Investissement (I) / Fonctionnement (F) ou HT et TTC	Année de l'engagement de l'action	Montant total HT	Montant total TTC
GO1	Animation et actions transversales - équipe technique dédiée et frais liés aux missions	Engagée	Syr'Usses	I et F	2022	9 100,0 €	503 989,0 €
GO2	Bilan du Contrat de Milieux - Evaluation et nouvelle programmation	Non engagée	Syr'Usses	F	2024		0,0 €

Volet Pilotage et coordination (2 actions)		
Non engagée	1	50%
Engagée	1	50%
